Commune de GOUESNOU
Place des Fusillés

29850 GOUESNOU
A l'attention de M Yannick BERNICOT

Remis contre accusé de réception

REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

D I A G N O S T I C
A S S I S T A N C E
T E C H N I Q U E

Code prestation : K161-3

RAPPORT N°:
15196898_01_Logement-de-fonction-de-la-poste

Lieu d'intervention :
Logement de fonction de la poste
1, rue Sœur Paul

29850 GOUESNOU

N° D'AFFAIRE :15196898 / 01
RAPPORT ETABLI LE : 23/03/2015

Agence de Brest
ZAC de Kergaradec
37 avenue du Baron Lacrosse CS 80166
29803 BREST CEDEX 9
N° SIRET : 41967142500314
Tél : 0298421444 - Fax : 0298025519

Agence de Brest
ZAC de Kergaradec
37 avenue du Baron Lacrosse CS 80166
29803 BREST CEDEX 9

Tél. : 0298421444
Fax : 0298025519
SIRET : 41967142500314

Logement de fonction de la poste
1, rue Sœur Paul

29850 GOUESNOU

Date d'intervention : 12/03/2015
Date de la commande : 10/03/2015

REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

K161-3

Adresse d'expédition : Commune de GOUESNOU

29850 GOUESNOU

A l'attention de M Yannick BERNICOT

Intervenant : M Jean-Paul PERRIN **Signature :** 	**Accompagné par :** Absence d'accompagnant Rendu compte à : Mr Yannick BERNICOT

Ce rapport comprend 24 pages.
Il est remis contre accusé de réception.

Avertissement : Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité

SOMMAIRE

1. SYNTHESE DES RESULTATS 5
1.1. Conclusions 5
1.2. Synthèse du repérage 5
1.3. Préconisations 10
2. GENERALITES 11
2.1. Objectif de la prestation 11
2.2. Références réglementaires 11
2.3. Analyse des échantillons 11
2.4. Commentaires relatifs au déroulement de la prestation 11
2.5. Rapport(s) précédent(s) 11
3. DESCRIPTION DU OU DES IMMEUBLES BATIS 12
3.1. Donneur d'ordre 12
3.2. Périmètre de la prestation 12
4. SCHEMA DE LOCALISATION 14
5. CERTIFICAT DE COMPETENCE 15
6. ATTESTATION D'ASSURANCE 16
7. ALBUM PHOTO 18

1. SYNTHESE DES RESULTATS

1.1. Conclusions

➢ **Nous n'avons pas recensé de matériaux et produits contenant de l'amiante** selon le programme de repérage défini au §3.2.

1.2. Synthèse du repérage

a) <u>MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE :</u>

LOCALISATION BATIMENT(S), ETAGE(S), LOCAUX OU ZONES HOMOGENES	MATERIAUX ET PRODUITS	CRITERES AYANT PERMIS DE CONCLURE
1er étage Salle de séjour	Revêtements de sol et murs / Revêtements de sol / Dalles plastiques	Analyse prélèvement Réf PV : E1
1er étage Salle de séjour	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joints d'assemblage (ex : joints plaques de plâtre) Mur en façade arrière	Analyse prélèvement Réf PV : E3
1er étage Salle de séjour	Façades / Menuiseries extérieures / Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure fenêtre gauche	Analyse prélèvement Réf PV : E4
1er étage Salle de séjour	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de plâtre projetés, lissés ou talochés cloison	Sur connaissance de l'opérateur
1er étage couloir 1	Revêtements de sol et murs / Revêtements de sol / Dalles plastiques	Analyse prélèvement Réf PV : E2
1er étage couloir 1	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de plâtre projetés, lissés ou talochés cloison	Sur connaissance de l'opérateur
1er étage WC	Revêtements de sol et murs / Revêtements de sol / Dalles plastiques	Analyse prélèvement Réf PV : E2
1er étage WC	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de plâtre projetés, lissés ou talochés cloison	Sur connaissance de l'opérateur
1er étage Dégagement cellier	Revêtements de sol et murs / Revêtements de sol / Dalles plastiques	Analyse prélèvement Réf PV : E2

LOCALISATION BATIMENT(S), ETAGE(S), LOCAUX OU ZONES HOMOGENES	MATERIAUX ET PRODUITS	CRITERES AYANT PERMIS DE CONCLURE
1er étage Dégagement cellier	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de plâtre projetés, lissés ou talochés cloison	Sur connaissance de l'opérateur
1er étage Cellier	Revêtements de sol et murs / Revêtements de sol / Dalles plastiques	Analyse prélèvement Réf PV : E2
1er étage Cellier	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de plâtre projetés, lissés ou talochés cloison	Sur connaissance de l'opérateur
1er étage Cellier	Façades / Menuiseries extérieures / Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure fenêtre gauche	Analyse prélèvement Réf PV : E4
1er étage Salle de douche	Revêtements de sol et murs / Revêtements de murs / Colle des faïences Au dessus de l'évier	Analyse prélèvement Réf PV : E5
1er étage Salle de douche	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de plâtre projetés, lissés ou talochés cloison	Sur connaissance de l'opérateur
1er étage Salle de douche	Revêtements de sol et murs / Revêtements de sol / Colle de carrelage	Sur connaissance de l'opérateur
1er étage Salle de douche	Revêtements de sol et murs / Revêtements de murs / Colle des plinthes En périphérie de la pièce	Analyse prélèvement Réf PV : E6
1er étage Cuisine	Revêtements de sol et murs / Revêtements de murs / Colle des faïences Au dessus de l'évier	Analyse prélèvement Réf PV : E5
1er étage Cuisine	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de plâtre projetés, lissés ou talochés cloison	Sur connaissance de l'opérateur
1er étage Cuisine	Revêtements de sol et murs / Revêtements de sol / Colle de carrelage	Sur connaissance de l'opérateur
1er étage Cuisine	Revêtements de sol et murs / Revêtements de murs / Colle des plinthes En périphérie de la pièce	Analyse prélèvement Réf PV : E6

LOCALISATION BATIMENT(S), ETAGE(S), LOCAUX OU ZONES HOMOGENES	MATERIAUX ET PRODUITS	CRITERES AYANT PERMIS DE CONCLURE
1er étage Cuisine	Façades / Menuiseries extérieures / Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure fenêtre gauche	Analyse prélèvement Réf PV : E4
1er étage Salle de bain 1	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de plâtre projetés, lissés ou talochés cloison	Sur connaissance de l'opérateur
1er étage Salle de bain 1	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joints d'assemblage (ex : joints plaques de plâtre) Mur en façade arrière	Analyse prélèvement Réf PV : E3
1er étage Salle de bain 1	Revêtements de sol et murs / Revêtements de murs / Colle des faïences Baignoire, douche, lavabos	Analyse prélèvement Réf PV : E8
1er étage Salle de bain 1	Revêtements de sol et murs / Revêtements de murs / Colle des plinthes En périphérie de la pièce	Analyse prélèvement Réf PV : E8
1er étage Salle de bain 1	Revêtements de sol et murs / Revêtements de sol / Colle de carrelage	Sur connaissance de l'opérateur
1er étage Chambre 1	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joints d'assemblage (ex : joints plaques de plâtre) Mur en façade	Analyse prélèvement Réf PV : E3
1er étage Chambre 1	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de plâtre projetés, lissés ou talochés cloison	Sur connaissance de l'opérateur
1er étage Chambre 1	Façades / Menuiseries extérieures / Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure fenêtre gauche	Analyse prélèvement Réf PV : E4
1er étage Chambre 2	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joints d'assemblage (ex : joints plaques de plâtre) Mur en façade	Analyse prélèvement Réf PV : E3
1er étage Chambre 2	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de plâtre projetés, lissés ou talochés cloison	Sur connaissance de l'opérateur

LOCALISATION BATIMENT(S), ETAGE(S), LOCAUX OU ZONES HOMOGENES	MATERIAUX ET PRODUITS	CRITERES AYANT PERMIS DE CONCLURE
1er étage Chambre 2	Façades / Menuiseries extérieures / Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure fenêtre gauche	Analyse prélèvement Réf PV : E4
1er étage Chambre 3	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joints d'assemblage (ex : joints plaques de plâtre) Mur en façade	Analyse prélèvement Réf PV : E3
1er étage Chambre 3	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de plâtre projetés, lissés ou talochés cloison	Sur connaissance de l'opérateur
1er étage Chambre 3	Façades / Menuiseries extérieures / Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure fenêtre gauche	Analyse prélèvement Réf PV : E4
1er étage Chambre 4	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joints d'assemblage (ex : joints plaques de plâtre) Mur en façade	Analyse prélèvement Réf PV : E3
1er étage Chambre 4	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de plâtre projetés, lissés ou talochés cloison	Sur connaissance de l'opérateur
1er étage Chambre 4	Façades / Menuiseries extérieures / Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure fenêtre gauche	Analyse prélèvement Réf PV : E4
1er étage Studio	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joints d'assemblage (ex : joints plaques de plâtre) Mur en façade	Analyse prélèvement Réf PV : E3
1er étage Studio	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de plâtre projetés, lissés ou talochés cloison	Sur connaissance de l'opérateur
1er étage Studio	Façades / Menuiseries extérieures / Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure fenêtre gauche	Analyse prélèvement Réf PV : E4
1er étage Studio	Revêtements de sol et murs / Revêtements de sol / Dalles plastiques	Analyse prélèvement Réf PV : E2

LOCALISATION BATIMENT(S), ETAGE(S), LOCAUX OU ZONES HOMOGENES	MATERIAUX ET PRODUITS	CRITERES AYANT PERMIS DE CONCLURE
1er étage Studio	Revêtements de sol et murs / Revêtements de murs / Colle des faïences Au dessus de l'évier	Analyse prélèvement Réf PV : E5
1er étage Sanitaire Studio	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joints d'assemblage (ex : joints plaques de plâtre) Mur en façade	Analyse prélèvement Réf PV : E3
1er étage Sanitaire Studio	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de plâtre projetés, lissés ou talochés cloison	Sur connaissance de l'opérateur
1er étage Sanitaire Studio	Revêtements de sol et murs / Revêtements de murs / Colle des faïences	Analyse prélèvement Réf PV : E5
1er étage Sanitaire Studio	Revêtements de sol et murs / Revêtements de sol / Colle de carrelage	Sur connaissance de l'opérateur
1er étage Sanitaire Studio	Revêtements de sol et murs / Revêtements de murs / Colle des plinthes En périphérie de la pièce	Analyse prélèvement Réf PV : E8

1.3. Préconisations

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modifications du périmètre ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'une investigation complémentaire appropriée dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

2. GENERALITES

2.1. Objectif de la prestation

La prestation a pour objectif de réaliser le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante dont le donneur d'ordre doit disposer avant réalisation de travaux dans un immeuble.

2.2. Références réglementaires

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,
Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
Articles L 4531-1, L4121-3 et R4412-97 du Code du travail
Article R1334-22 du code de la Santé publique
Tableau A1 de la Norme NF X 46 020 de Décembre 2008.

2.3. Analyse des échantillons

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

Nom et Adresse du laboratoire :
CARSO : 4 Avenue Jean Moulin - 69200 VENISSIEUX
Numéro Accréditation : 1-1531

2.4. Commentaires relatifs au déroulement de la prestation

Le présent document concerne des matériaux ou produits figurant dans le tableau A1 de la norme NF X 46 020, ainsi que les matériaux ou produits réputés contenir de l'amiante ne figurant pas dans le dit tableau.

Les investigations approfondies avec sondages destructifs ont été réalisées en notre présence pendant la visite.

2.5. Rapport(s) précédent(s)

Les rapports précédents relatifs à l'amiante qui nous ont été remis avant la visite sont :

REFERENCE DU RAPPORT	ORGANISME EMETTEUR	DATE	TYPE DE REPERAGE	CONCLUSIONS
2005-12-DTA-019	Sarl BRETAGNE EXPERTISE	13/02/2006	Rapport de repérage en vue de constitution du DTA	Absence de produit ou matériaux contenants de l'amiante

Notre rapport prend en compte les documents techniques fournis en l'état.

3. DESCRIPTION DU OU DES IMMEUBLES BATIS

Logement

3.1. Donneur d'ordre

Nom ou raison sociale : Commune de GOUESNOU
Adresse : Place des Fusillés
Code postal : 29850
Ville : GOUESNOU

3.2. Périmètre de la prestation

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité.

a) <u>Liste des locaux visités</u>

L'objet du présent rapport concerne la ou les partie(s) d'immeubles bâtis décrite(s) dans le tableau suivant :

PARTIE DE BATIMENT	LOCAUX
1er étage	Salle de séjour
1er étage	couloir 1
1er étage	WC
1er étage	Dégagement cellier
1er étage	Cellier
1er étage	Salle de douche
1er étage	Cuisine
1er étage	Salle de bain 1
1er étage	Chambre 1
1er étage	Chambre 2
1er étage	Chambre 3
1er étage	Chambre 4
1er étage	Studio
1er étage	Sanitaire Studio

Le donneur d'ordre nous a communiqué les documents et informations suivants :

- Fonction principale du bâtiment : Habitation (parties privatives d'immeuble collectif d'habitation)
- Le périmètre de repérage : Ensemble de l'immeuble
- La date de délivrance du permis de construire ou années de construction et de réhabilitation : <01/07/1997

En cas d'omissions ou d'imprécisions dans les informations fournies à l'opérateur, des investigations complémentaires pourraient s'avérer nécessaires ultérieurement.

c) périmètre des travaux

La description des travaux à l'origine de ce repérage, a été définie par :

☐ le document rédigé par le :

☐ l'accompagnateur nommé en page de garde du rapport

- Programme de travaux :
  - absence de programme défini
- Nature et localisation des travaux antérieurs de rénovation ou de réaménagement :

☒ : Absence de travaux antérieurs signalés par l'accompagnateur représentant désigné par l'exploitant et/ou le maître d'ouvrage et/ou le donneur d'ordre
☐ : Présence de travaux antérieurs signalés avant ou pendant la visite

Zone ayant fait l'objet de travaux	Nature des travaux	date

Ces informations sont nécessaires pour la définition des zones présentant des similitudes d'ouvrage car elles correspondent à la base de nos investigations.

Les résultats d'analyses des prélèvements effectués sont alors, par hypothèse, généralisés sur l'ensemble des composants, types de matériaux et produits ayant les mêmes caractéristiques.

En cas d'omissions ou d'imprécisions dans les informations fournies à l'opérateur, des investigations complémentaires pourraient s'avérer nécessaires ultérieurement.

Toute modification du périmètre de repérage impose la réalisation d'investigations complémentaires.

4. SCHEMA DE LOCALISATION

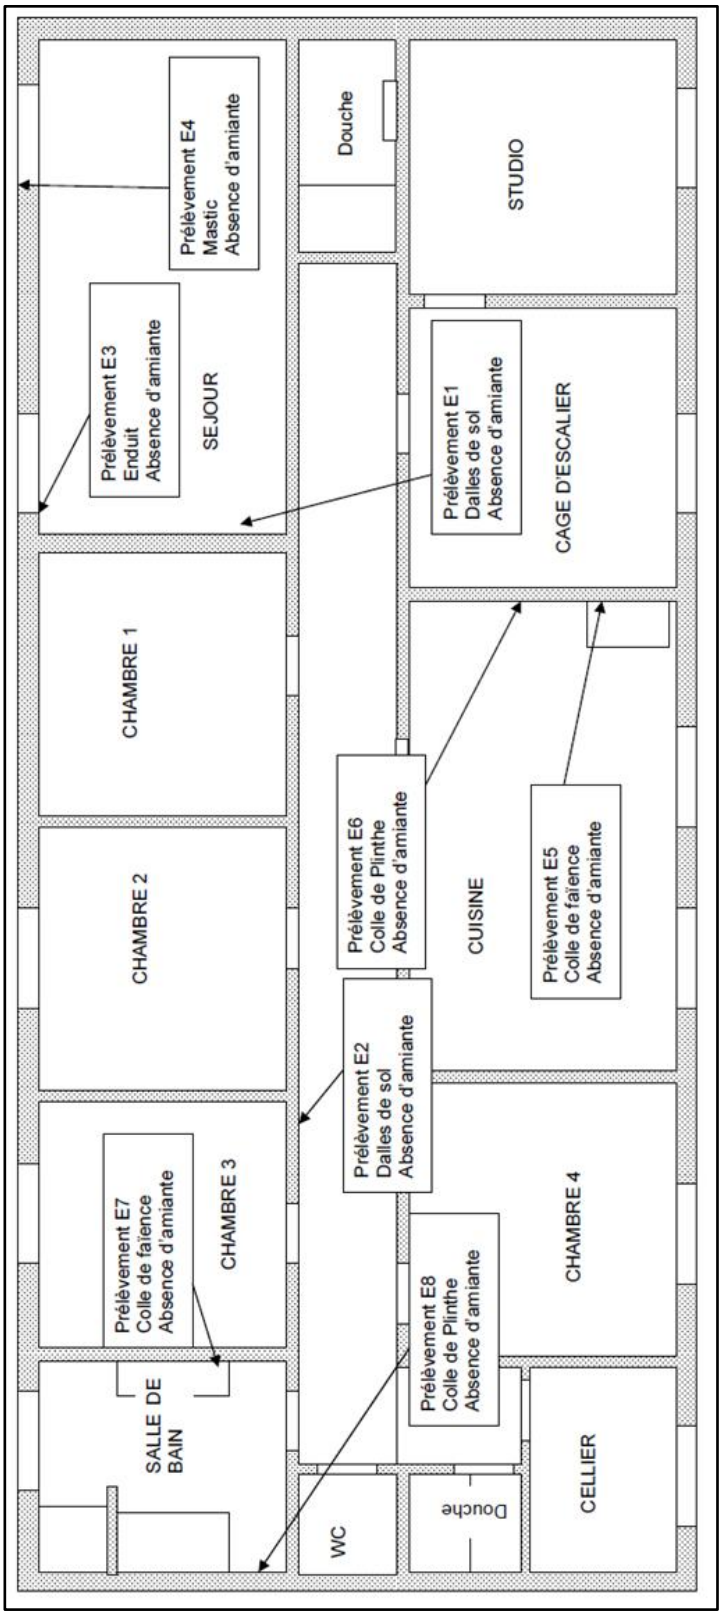

5. CERTIFICAT DE COMPETENCE

apave certification

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES N°A/12-483r1

Apave Certification certifie que :

Monsieur PERRIN Jean-Paul

Possède les compétences techniques nécessaires à la certification suivant le référentiel :

Apave Certification AC-PRO-001-08 (du 01/02/12)

Conforme aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024 : 2003 et à l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification

Pour l'activité suivante :

DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER – AMIANTE

Emis le :

24 octobre 2012

Ce certificat est valable jusqu'au :

23 octobre 2017

Directeur d'Apave Certification

JM VIONNET

cofrac
CERTIFICATION D'ENTREPRISES & DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0521 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Apave Certification – 191, rue de Vaugirard – 75738 Paris Cedex 15 - Sarl au capital de 300 000 € - RCS Paris 500 229 398 – SIRET : 500 229 398 00010 – APE : 7120B

AC-IMP-012-10

6. ATTESTATION D'ASSURANCE

Contrat RC n° 5271124804 1/2

AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
Télécopie 01.57 65 07 90

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313, Terrasse de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, agissant en qualité d'apériteur en coassurance à 60% avec GENERALI, atteste par la présente que l'assuré :

APAVE
191 rue Vaugirard
75015 PARIS

Agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE NORD-OUEST SAS.**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 5271124804, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**

Cette attestation est notamment délivrée dans le cadre des activités de diagnotics amiante, plomb et déchets de construction.

Contrat RC n° 5271124804 2/2

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus *Sans pouvoir excéder pour :*	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada *sous-limités :* c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	5 000 000 € par année d'assurance 1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

***Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2015 au 31/12/2015** inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 15/12/2014
Pour servir et valoir ce que de droit.

POUR L'ASSUREUR :

VERLINGUE
COURTIER EN ASSURANCES
Adresse postale :
12, rue de Kerogan - CS 44012
29335 QUIMPER cedex
Tél. 0 820 260 260 (0,118 € TTC/mn) Fax 0 820 209 242
contact@verlingue.fr - www.verlingue.fr

7. ALBUM PHOTO

LOCALISATION	MATERIAUX ET/OU PRODUITS OBJET DES PRELEVEMENT
1er étage Salle de séjour Matériau : Revêtements de sol et murs / Revêtements de sol / Dalles plastiques **ABSENCE D'AMIANTE**	
1er étage Salle de séjour Matériau : Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joints d'assemblage (ex : joints plaques de plâtre) Mur en façade arrière **ABSENCE D'AMIANTE**	
1er étage Salle de séjour Matériau : Façades / Menuiseries extérieures / Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure fenêtre gauche **ABSENCE D'AMIANTE**	

1er étage couloir 1 Matériau : Revêtements de sol et murs / Revêtements de sol / Dalles plastiques **ABSENCE D'AMIANTE**	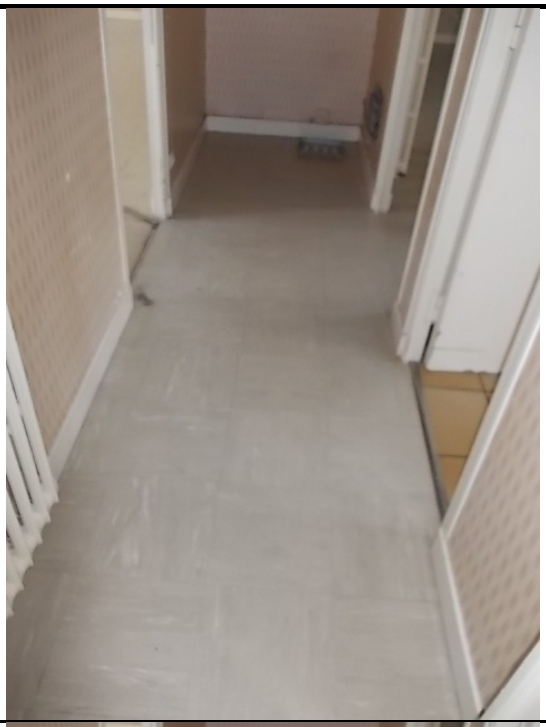
1er étage WC Matériau : Revêtements de sol et murs / Revêtements de sol / Dalles plastiques **ABSENCE D'AMIANTE**	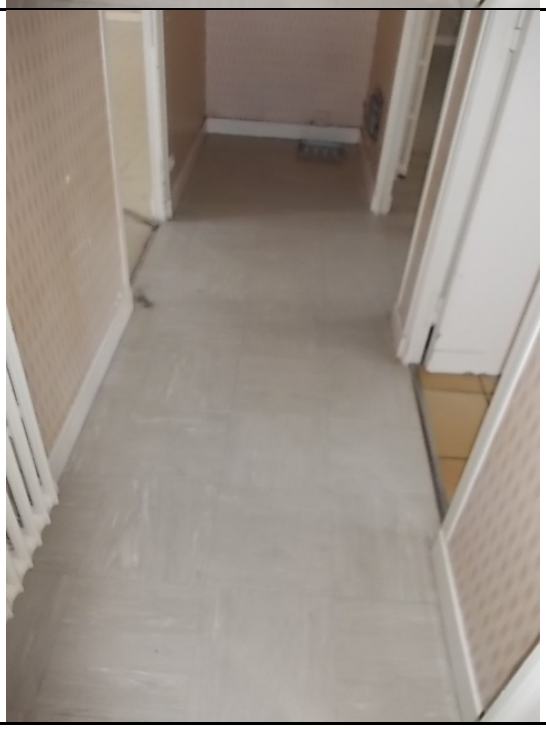

1er étage Dégagement cellier Matériau : Revêtements de sol et murs / Revêtements de sol / Dalles plastiques **ABSENCE D'AMIANTE**	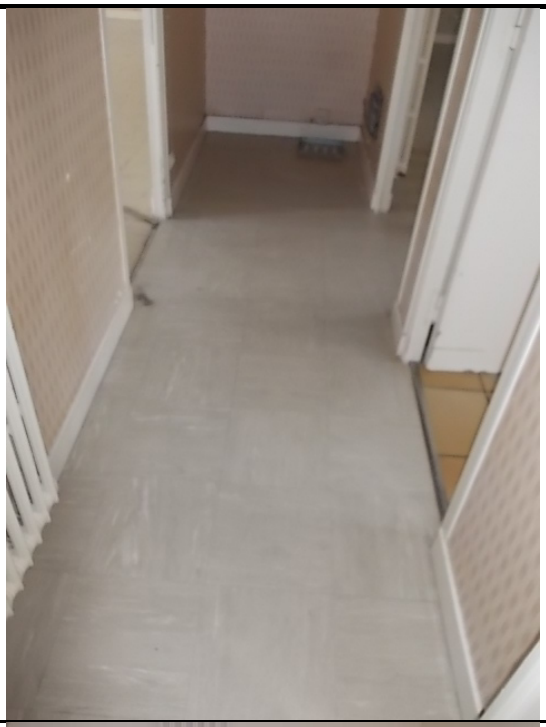
1er étage Cellier Matériau : Revêtements de sol et murs / Revêtements de sol / Dalles plastiques **ABSENCE D'AMIANTE**	
1er étage Salle de douche Matériau : Revêtements de sol et murs / Revêtements de murs / Colle des faïences Au dessus de l'évier **ABSENCE D'AMIANTE**	

1er étage Cuisine Matériau : Revêtements de sol et murs / Revêtements de murs / Colle des faïences Au dessus de l'évier **ABSENCE D'AMIANTE**	
1er étage Cuisine Matériau : Revêtements de sol et murs / Revêtements de murs / Colle des plinthes En périphérie de la pièce **ABSENCE D'AMIANTE**	
1er étage Salle de bain 1 Matériau : Revêtements de sol et murs / Revêtements de murs / Colle des faïences Baignoire, douche, lavabos **ABSENCE D'AMIANTE**	

1er étage Salle de bain 1 Matériau : Revêtements de sol et murs / Revêtements de murs / Colle des faïences Baignoire, douche, lavabos **ABSENCE D'AMIANTE**	
1er étage Salle de bain 1 Matériau : Revêtements de sol et murs / Revêtements de murs / Colle des plinthes En périphérie de la pièce **ABSENCE D'AMIANTE**	

1er étage Studio Matériau : Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joints d'assemblage (ex : joints plaques de plâtre) Mur en façade **ABSENCE D'AMIANTE**	
1er étage Studio Matériau : Revêtements de sol et murs / Revêtements de sol / Dalles plastiques **ABSENCE D'AMIANTE**	

1er étage Sanitaire Studio Matériau : Revêtements de sol et murs / Revêtements de murs / Colle des faïences **ABSENCE D'AMIANTE**	
1er étage Sanitaire Studio Matériau : Revêtements de sol et murs / Revêtements de murs / Colle des plinthes En périphérie de la pièce **ABSENCE D'AMIANTE**	
